



Ministerio de Transporte
Republica de Colombia

Prosperidad
para todos

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas





Ministerio de Transporte
República de Colombia

QUIÉNES SOMOS

2011-2012



Los encargados de planes, programas y proyectos de las vías nacionales y de la infraestructura fluvial y marítima no concesionada





Ministerio de Transporte
República de Colombia

PROGRAMAS QUE EJECUTAMOS

2011-2012



- Atención de Emergencias
- Corredores de Prosperidad
- Grandes Proyectos
- Plan 2.500
- PSCN
- Red Nacional: Rehabilitación y Mantenimiento
- Marítimo y fluvial
- Caminos para la prosperidad





Segundas Calzadas

Meta 2011 + Meta 2012:

18 km + 20 km = **38 km**

Ejecución 2011+ Ejecución 2012:

7 km + 6 km = **13 km**



Km de mantenimiento rutinario de Red Terciaria

Caminos para la Prosperidad

Meta 2011+ Meta 2012:

7.476 km + 14.175 km = **24.651 km**

Ejecución 2011+ Ejecución 2012:

4.922 km + 341 km = **5.263 km**



Mantenimiento periódico

Meta 2011+ Meta 2012:

513 km + 368 km = **881 km**

Avance 2011+ Avance 2012:

601 km + 75 km = **677 km**





Construcción de Puentes

Meta 2011+ Meta 2012:

26+ 52 = **78**

Ejecución 2011+ Ejecución 2012:

28 + 12= **40**



Km pavimentados

Meta 2011+ Meta 2012:

282 km + 378 km = **661 km**

Ejecución 2011+ Ejecución 2012:

338km + 69km = **408 km**



Metros lineales de túneles construidos

Meta 2011+ Meta 2012:

7.273 mts + 4.694 mts = **11.967 mts**

Ejecución 2011+ Ejecución 2012:

6.460 mts+ 1.160,70 mts = **7620.70 mts**



Estudios y diseños terminados

Meta 2011+ Meta 2012:

3+33= **36**

Ejecución 2011+ Ejecución 2012:

3+ 0= **3**





Ministerio de Transporte
República de Colombia

ATENCIÓN EFICIENTE
DE EMERGENCIAS

2011-2012

Prosperidad
para todos

ATENCIÓN EFICIENTE DE EMERGENCIAS





Ministerio de Transporte
República de Colombia

ATENCIÓN EFICIENTE
DE EMERGENCIAS

2011-2012

Prosperidad
para todos

**\$ 424.364
Millones**

**Colombia
Humanitaria**



**\$ 500.000
Millones**



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MÁS KILÓMETROS DE VIDA





- Habilitar la transitabilidad de vías Nacionales
- Atención de puntos críticos

*Atención de 1.000 eventos en 2.500 km
y de más de 1.600 km en 27 departamentos





RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

Seguimiento ejecución convenio de \$50.000 M
(fecha suscripción 17 feb de 2011)

DEPARTAMENTO	VALOR CONTRATO/ MILLONES DE PESOS
SANTANDER	\$ 27.899
CAUCA	\$ 3.300
CALDAS	\$ 3.599
TOLIMA	\$ 2.948
ATLÁNTICO	\$ 9.999
ANTIOQUIA	\$ 2.145

TOTAL
\$49.893 M.

TOTAL DE PROYECTOS 12
PROYECTOS TERMINADOS 11
PROYECTOS PENDIENTES 1
Porcentaje avance físico:
98,52%





RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

Seguimiento ejecución convenio de \$237.120 M.

(fecha de suscripción 17 mar. de 2011)

DEPARTAMENTO	VALOR CONTRATO /Millones	DEPARTAMENTO	VALOR CONTRATO /Millones
ANTIOQUIA	\$ 31.344	LA GUAJIRA	\$ 4.892
ARAUCA	\$ 5.999	MAGDALENA	\$ 11.214
ATLÁNTICO	\$ 13.199	NARIÑO	\$ 4.150
BOLIVAR	\$ 2.497	NORTE DE SANTANDER	\$ 20.464
BOYACÁ	\$ 8.799	PUTUMAYO	\$ 9.300
CALDAS	\$ 17.048	RISARALDA	\$ 11.550
CAQUETÁ	\$ 7.117	SANTANDER	\$ 15.599
CAUCA	\$ 9.449	SUCRE	\$ 14.398
CESAR	\$ 19.795	VALLE DEL CAUCA	\$ 7.200
CORDOBA	\$ 10.000		
CUNDINAMARCA	\$ 5.999		

TOTAL:
\$ 229.552 M.

TOTAL DE PROYECTOS 41

PROYECTOS TERMINADOS 21; 7 por encima del 90%; 13 que se terminarán de acuerdo a cronograma establecido por la Contraloría a 30 de diciembre

Porcentaje de avance físico: 83% al 24 de junio





Ministerio de Transporte
República de Colombia

RECURSOS

2011-2012

Prosperidad
para todos

RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

Seguimiento ejecución convenio de \$67.380 M.
(fecha de inicio 5 jul. de 2011)

**TOTAL
\$60.357 M**

DEPARTAMENTO	VALOR CONTRATO /Millones	DEPARTAMENTO	VALOR CONTRATO/Millones
LA MOJANA	\$ 7.000	LA GUAJIRA	\$ 2.500
BOYACÁ	\$ 3.195	NARIÑO	\$ 3.000
CALDAS	\$ 3.711	NORTE DE SANTANDER	\$ 5.000
CAUCA	\$ 30.000	QUINDÍO - TOLIMA	\$ 6.000
CÓRDOBA	\$ 4.000		

TOTAL DE PROYECTOS 11

PROYECTOS TERMINADOS 5; 1 en 97%;

5 se terminarán acorde al cronograma establecido por la
Contraloría (30 de diciembre)

Porcentaje de avance físico: 84,28% al 24 de junio





Ministerio de Transporte
República de Colombia

RECURSOS

2011-2012

Prosperidad
para todos

RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

Seguimiento ejecución convenio de \$69.864 M (fecha de inicio 24 de Oct. de 2011)

DEPARTAMENTO	VALOR CONTRATO En millones	DEPARTAMENTO	VALOR CONTRATO en Millones
ARAUCA	\$ 1.517	GUAVIARE	\$ 1.000
ANTIOQUIA	\$ 2.730	HUILA	\$ 3.200
BOYACÁ	\$ 5.190	MAGDALENA	\$ 3.000
CALDAS	\$ 2.042	META	\$ 2.289
CASANARE	\$ 1.000	NARIÑO	\$ 8.200
CAQUETÁ	\$ 948	NORTE DE SANTANDER	\$ 3.313
CAUCA	\$ 204	QUINDÍO	\$ 2.550
CESAR	\$ 1.149	RISARALDA	\$ 190
CHOCÓ	\$ 998	SANTANDER	\$ 2.540
CÓRDOBA	\$ 159	TOLIMA	\$ 5.170
CUNDINAMARCA	\$ 13.200	VALLE	\$ 1.088

Total de
proyectos 32

22 PUENTES

10 TRAMOS DE VÍAS AFECTADAS

Avance físico: 41,87% al 24 de junio

*Estudios complejos





Ministerio de Transporte
República de Colombia

RESUMEN EJECUCIÓN CONVENIOS

2011-2012



RESUMEN EJECUCIÓN CONVENIOS DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

PROYECTO	VALOR CONVENIO Millones	EJECUCIÓN
CONVENIO 50.000 MILLONES	\$ 49.893	98,52%
CONVENIO 237.000 MILLONES	\$ 229.592	83 %
ADICIÓN 67.380 MILLONES (NO SE INCLUYE APOYO A LA GESTIÓN)	\$ 60.357	84,28%
TOTAL	\$ 339.842	

CONCEPTO	VALOR Millones	EJECUCIÓN % SOLICITUD
SOLICITUD PARA VÍAS (Recursos en ejecución)	\$ 28.294	
SOLICITUD PARA PUENTES (Recursos en ejecución)	\$ 41.570	
TOTAL	\$ 69.864	41,87%
TOTAL INVERTIDO	\$404.706	





Ministerio de Transporte
República de Colombia

RECURSOS

2011-2012

Prosperidad
para todos

**\$ 500.000
Millones**



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MÁS KILÓMETROS DE VIDA

Red Nacional

Recursos de la Sub Dirección de la Red Nacional de Carreteras, contratos de mantenimiento y rehabilitación y corredores de prosperidad.





Ministerio de Transporte
República de Colombia

2011-2012

Prosperidad
para todos

EJEMPLOS EFICIENTES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS





Ministerio de Transporte
República de Colombia

ATENCIÓN EFICIENTE
DE EMERGENCIAS

2011-2012

Prosperidad
para todos

Tarazá -Caucasia

100% Ejecutada
\$13.998
millones

Antes



Después





Ministerio de Transporte
República de Colombia

ATENCIÓN EFICIENTE
DE EMERGENCIAS

2011-2012



HONDA - VILLETA

100% Ejecutada
\$5.999
millones

Antes



Después





Ministerio de Transporte
República de Colombia

ATENCIÓN EFICIENTE
DE EMERGENCIAS

2011-2012

Prosperidad
para todos

LOS CUROS - MÁLAGA

100% Ejecutada
\$3.059
millones

Antes



Después





Ministerio de Transporte
República de Colombia

ATENCIÓN EFICIENTE
DE EMERGENCIAS

2011-2012

Prosperidad
para todos

OCAÑA – CONVENCION

99,31% Ejecutada
\$3.876 millones

Antes



Después





Ministerio de Transporte
República de Colombia

ATENCIÓN EFICIENTE
DE EMERGENCIAS

2011-2012

Prosperidad
para todos

PASTO – MOJARRAS

Antes



Después



100% Ejecutada
\$4.150 millones





Ministerio de Transporte
República de Colombia

2011-2012

Prosperidad
para todos

CORREDORES DE PROSPERIDAD





Ministerio de Transporte
República de Colombia

CORREDORES DE PROSPERIDAD

2011-2012



CONSTRUCCIÓN DE DOBLES CALZADAS

Meta 2011: 7 km

Avance a dic. 2011: 1,15 km

Meta 2012: 16,70 km

Avance Enero- Abril 2012: 0,40 km

Total acumulado a 30 de Abril de 2012: 1,55 km



CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Meta 2011: 20

Avance a dic. 2011: 12

Meta 2012: 26,60

Avance Enero- Abril 2012: 5

Total acumulado a 30 de Abril de 2012: 17





Ministerio de Transporte
República de Colombia

CORREDORES DE PROSPERIDAD

2011-2012

Prosperidad
para todos

METROS LINEALES DE TÚNELES

Meta 2011: 2.573

Avance a dic. 2011: 2.700 mts

Meta 2012: 1.762 mts

Avance Enero- Abril 2012: 460,7 mts

**Total acumulado a 30 de Abril de
2012:** 3.160,70 mts



PAVIMENTACIÓN

Meta 2011: 173,30 km

Avance a dic. 2011: 146,45 km

Meta 2012: 255,80 km

Avance Enero- Abril 2012: 37,52 km

**Total acumulado a 30 de Abril de
2012:** 183,97 km





Ministerio de Transporte
República de Colombia

CORREDORES DE PROSPERIDAD

2011-2012

Prosperidad
para todos

MANTENIMIENTO PERIÓDICO



Meta 2011: 250 km

Avance a dic. 2011: 293,40 km

Meta 2012: 111 km

Avance Enero- Abril 2012: 7 km

Total acumulado a 30 de Abril de 2012: 300,40 km





Ministerio de Transporte
República de Colombia

CORREDORES DE PROSPERIDAD

2011-2012

Prosperidad
para todos

TRANSPARENCIA EN ADJUDICACIONES

Inversión total:
3.6 Billones

- Inversión en nuevos proyectos por : **\$2.24 billones** ✓
- Número de Proyectos: 16 corredores
- Actividades: Rehabilitación, construcción y mantenimiento de red vial
- Alcance:
 - 774 km
 - 36 km de doble calzada
 - 63 puentes
 - 4 túneles

Plazo máx. para culminación de obras: 51 meses ✓
aprox. desde la fecha de inicio.





Ministerio de Transporte
República de Colombia

CORREDORES DE PROSPERIDAD

2011-2012

Prosperidad
para todos

MEDELLÍN - QUIBDÓ



**\$254.560
millones**

Adjudicación de obra:

Transversal Medellín – Quibdó fase II

Km a pavimentar: 71

Puentes a construir 7

Plazo máx. entrega de obras: 51 meses





Ministerio de Transporte
República de Colombia

CORREDORES DE PROSPERIDAD

2011-2012



TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO



**\$246.312
millones**

Adjudicación de obra:

Tadó- La Virginia

Km a pavimentar: 57,30

Plazo máx. entrega de obras: 52 meses





Ministerio de Transporte
República de Colombia

CORREDORES DE PROSPERIDAD

2011-2012

Prosperidad
para todos

TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR



**\$236.136
millones**

Adjudicación de obra:

Popayán – La Plata

Km a pavimentar: 45

Puentes a construir :2

Plazo máx. entrega de obras: 51 meses





Ministerio de Transporte
República de Colombia

CORREDORES DE PROSPERIDAD

2011-2012

Prosperidad
para todos

BUGA - BUENAVENTURA



**\$233.095
millones**

Adjudicación de obra:

Construcción de la segunda calzada del sector Playa Larga y adecuación y rectificación de la calzada existente en Altos de Zaragoza-Cisneros

Puentes a construir: 7

Segunda calzada: 4,75 km

Viaductos: 5





Ministerio de Transporte
República de Colombia

GRANDES PROYECTOS

2011-2012

Prosperidad
para todos

GRANDES PROYECTOS



TÚNEL DE LA LÍNEA



**\$640.000
millones**

Adjudicación de obra: Túnel del La Línea

Kms pavimentados: 9

Metros lineales excavados de túnel:

Sección completa 3.495

Sección superior 6.453

Fecha de entrega de obra: Septiembre de 2013

Fecha entrega contrato: Septiembre de 2018



Ministerio de Transporte
República de Colombia

GRANDES PROYECTOS

2011-2012

Prosperidad
para todos

ANCÓN SUR - PRIMAVERA



**\$174.000
millones**

Obra: Doble Calzada Ancón Sur -Primavera

Valor contratado: \$174.000 millones

67% Ejecución: de obra tramo 1

Puentes construidos: 3

Adjudicación tramo 2: a mayo 2012 por: \$174.626

Construcción de segunda calzadas a Abril 30 de 2012: 0,50 km





Ministerio de Transporte
República de Colombia

2011-2012

Prosperidad
para todos

RED NACIONAL VIAL





Ministerio de Transporte
República de Colombia

RED NACIONAL

2011-2012

Prosperidad
para todos

Vías transitables y seguras MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO



\$1.2 Billones
PROYECTOS
NUEVOS

Meta 2011: Mantenimiento Rutinario de 11.463 km

Avance a dic. 2011: 11.823 km

Meta 2012: 11.212 km

Avance Enero- Abril 2012: 11.233,97 km

Total acumulado a 30 de Abril de 2012:
11.233,97 km

Inversión 2012 nuevos proyectos: 1.523 km de mantenimiento y rehabilitación.

Actividades:

Publicación de 28 pre-pliegos para procesos licitatorios de 28 corredores viales.





Ministerio de Transporte
República de Colombia

RED NACIONAL

2011-2012

Prosperidad
para todos

Vías transitables y seguras MANTENIMIENTO PERIÓDICO



349,86 km
Acumulado
2012

Meta 2011: 255 km

Avance a dic. 2011: 281,06 km

Meta 2012: 257 km

Avance Enero- Abril 2012: 68,8 km

Total acumulado a 30 de Abril de 2012: 349,86 km





Ministerio de Transporte
República de Colombia

2011-2012

Prosperidad
para todos

MARÍTIMO Y FLUVIAL



REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y PROFUNDIZACIÓN DE CANAL DE ACCESO Y CONSTRUIR OBRAS FLUVIALES



**2 GRANDES
OBRAS
REALIZADAS**

Meta 2011: 1 obra de mantenimiento y profundización del canal de acceso al Puerto de B/ventura

Avance a dic. 2011: 1 obra Puerto de B/ventura

Meta 2012: 1 obra de mantenimiento y profundización del canal de acceso al Puerto de B/quilla

Avance Enero- Abril 2012: 1 obra Puerto de B/quilla

CANAL DE ACCESO PUERTO DE BARRANQUILLA

*INVÍAS fue facultado por el Congreso para invertir recursos en obras de encauzamiento y dragado



Hoy : a cargo de Cormadgalena
A futuro: INVÍAS y Cormadgalena
*Falta sanción presidencial



Ministerio de Transporte
República de Colombia

2011-2012

Prosperidad
para todos

RED TERCIARIA Y FÉRREA





Ministerio de Transporte
República de Colombia

RED TERCIARIA Y FÉRREA

2011-2012

Prosperidad
para todos

CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD



Recursos
\$1,6 Billones

Meta 2011: Mantenimiento a 7.476 km

Avance a dic. 2011: 4.922,20 km

Meta 2012: 14.175 km

Avance Enero- Abril 2012: 341,99 km

Total acumulado a 30 de Abril de 2012:
5.263,99 km

Meta Cuatrienio 2010-2014:

Inversión: 1.6 billones

Alcance: 50.000 km

Generación de empleo: 12.000 mano de obra no calificada





Ministerio de Transporte
República de Colombia

RED TERCIARIA Y FÉRREA

2011-2012

Prosperidad
para todos

CONVENIO PARA ATENCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL



INVÍAS destinó recursos por **\$2.456 millones** para atender las estaciones de ferrocarril declaradas como Bienes de Interés Cultural. Para ello firmó un convenio con el Ministerio de Cultura.





Ministerio de Transporte
República de Colombia

2011-2012

Prosperidad
para todos

ESTUDIOS Y DISEÑOS BIEN ESTRUCTURADOS





Ministerio de Transporte
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS BIEN ESTRUCTURADOS

2011-2012

Prosperidad
para todos



PRESUPUESTO
2012
\$76.792
Millones

Meta 2011: Adelantar 3 estudios de preinversión

Avance a dic. 2011: 3 estudios

Meta 2012: 33 estudios terminados

Avance Enero- Abril de 2012: 0

Total acumulado a 30 de Abril 2012: 3 estudios

Inversión total 2011: \$148.000 millones así:

\$70.651 millones, presupuesto 2011

\$72.000 millones, vigencia 2012

\$7.500 millones, vigencia 2013

En 2012: En ejecución: 46

Por contratar: 21

Nuevos recursos por: \$30.000 millones





Ministerio de Transporte
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS BIEN ESTRUCTURADOS

2011-2012



BIEN ESTRUCTURADOS



**PUENTE
PUMAJERO**

**INVERSIÓN
\$10.000
Millones**

Complementación de los estudios y diseños definitivos, (Fase III), para la solución integral del paso sobre el río Magdalena en Barranquilla; con un plazo de 12 meses, adjudicada en licitación.

**Inversión obra + interventoría:
Más de \$10.000 millones.**





Ministerio de Transporte
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS
BIEN ESTRUCTURADOS

2011-2012



Estudios a nivel Fase III de la vía Timbío- El Estanquillo

Departamento: Cauca

Valor adjudicación de la obra incluido IVA: **\$7.364 millones**

Adjudicado a: Consorcio Concol Cusa

Interventoría: **\$1.840 millones**

Adjudicado a: Geicol S.A.

Estudios a nivel Fase III de la carretera B/manga- Alto El Escorial

Departamento: Santander

Valor adjudicación de la obra incluido IVA: **\$9.490 millones**

Adjudicado a: Consorcio Diseños Viales

Interventoría: **\$ 2.372 millones**

Adjudicado a: Consorcio Disevial





Ministerio de Transporte
República de Colombia

2011-2012



PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES





Ministerio de Transporte
República de Colombia

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES

2011-2012



ENTREGA DE NUEVOS EQUIPOS Y AULAS MÓVILES



El PSCN adquirió **75 motos y 8 grúas** y dos aulas móviles
para reforzar la seguridad vial.

Inversión 2011: \$39.679 millones

Inversión 2012: \$ 55.777 millones





Ministerio de Transporte
República de Colombia

2011-2012

Prosperidad
para todos

RESUMEN ADJUDICACIONES





GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS PROYECTOS

PROCESOS	LICITACIÓN PÚBLICA		
	No. DE PROCESOS	VALOR PROCESOS	No. DE PROPUESTAS
Grandes, corredores para la prosperidad	16	3,6 Billones	195
Medianos, corredores de mantenimiento y rehabilitación	28	1,2 Billones	EN TRÁMITE
Pequeños, menores procesos	47	72.733 Millones	EN TRÁMITE
TOTAL	91	4,87 Billones	





Ministerio de Transporte
República de Colombia

RESUMEN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

2011-2012



Proyectos en ejecución 2010-2014




- ✓ Corredores para la prosperidad ➤ \$ 3,6 billones
- ✓ Corredores de rehabilitación y mantenimiento ➤ \$ 1,2 billones
- ✓ Grandes Proyectos de conectividad ➤ \$ 1,2 billones
- ✓ Caminos para la Prosperidad ➤ \$ 1,6 billones
- ✓ **Total inversión 2010-2014** ➤ **\$7,6 billones**



2011-2012

Prosperidad
para todos

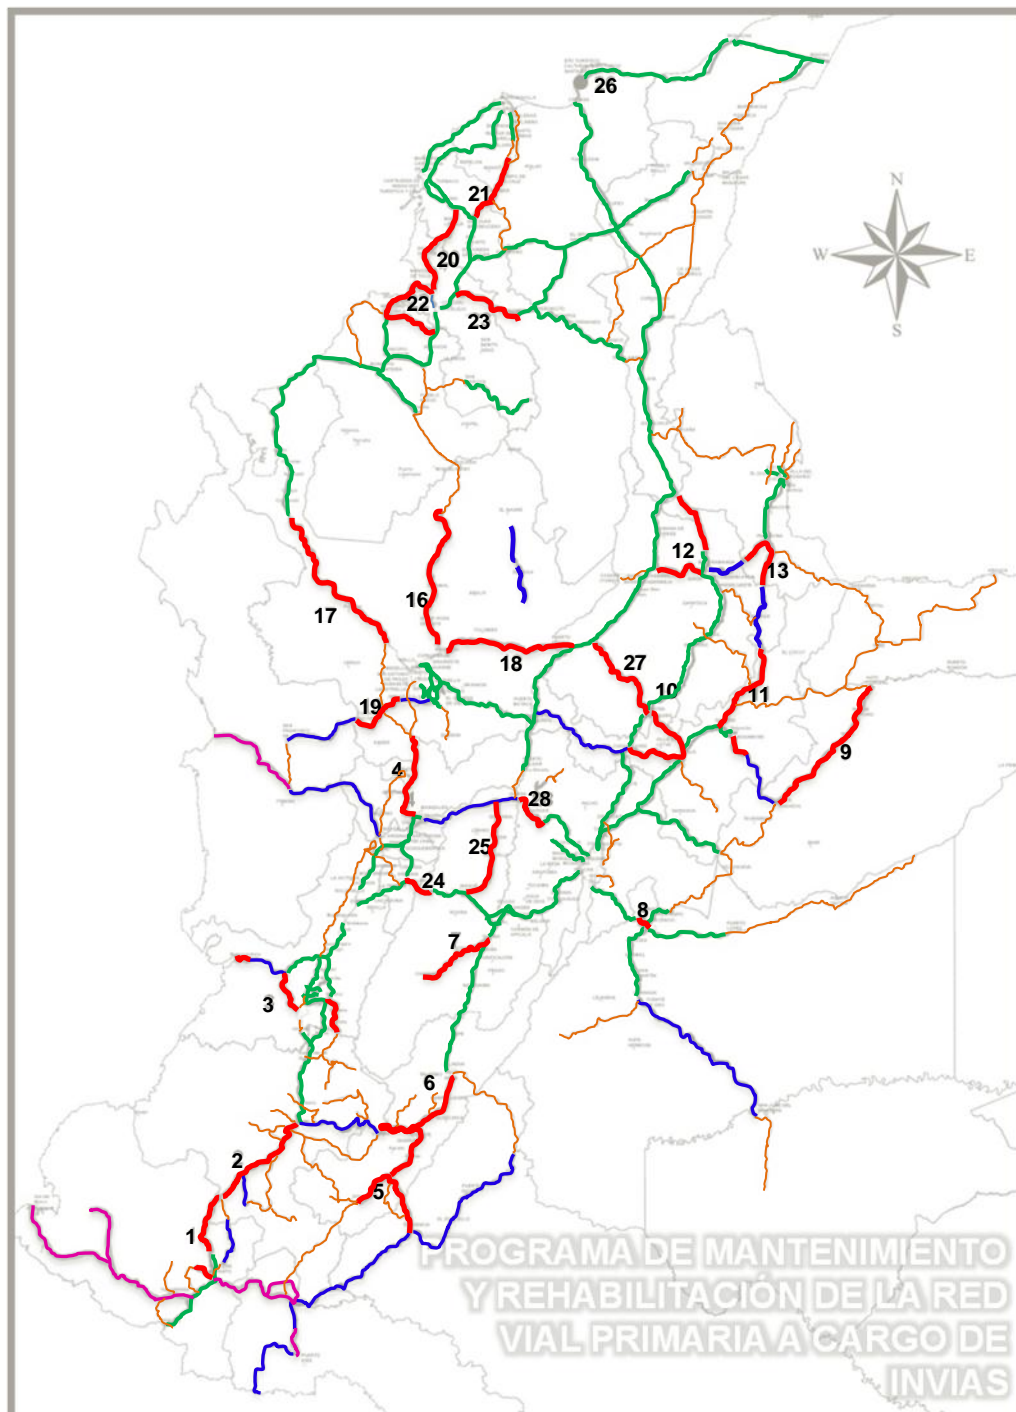

CORR.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION SRN	LONG (km)	DEP.
1	AEROPUERTO – REMOLINO – MOJARRAS; PASTO – LA FLORIDA	67.96	NARIÑO
2	MOJARRAS – POPAYAN; VARIANTE DE POPAYAN	75.65	CAUCA
3	VIA ALTERNA INTERNA AL PUERTO DE BUENAVENTURA; CALI – LOBOGUERRERO; RIO DESBARATADO - PALMIRA	55.24	VALLE DEL CAUCA
4	CHINCHINA – ESTACION URIBE; LA MANUELA – LA PINTADA	46.34	CALDAS
5	FLORENCIA – ALTAMIRA; PITALITO - GARZON	90.48	CAQUETA
6	GARZON – NEIVA; LA PLATA - LABERINTO	91.69	HUILA
7	CHAPARRAL - GUAMO	45.07	TOLIMA
8	PIPIRAL - VILLAVICENCIO	15.30	META
9	AGUAZUL – HATO COROZAL	71.69	YOPAL
10	BARBOSA – TUNJA - CHIQUINQUIRA	58.74	BOYACA
11	DUITAMA – LA PALMERA; SOGAMOSO – EL CRUCERO	102.25	BOYACA
12	RIONEGRO – SAN ALBERTO; BARRANCABERMEJA - LEBRIJA	106.86	SANTANDER
13	PRESIDENTE – PAMPLONA - CUESTABOBA	55.91	NORTE DE SANTANDER
14	CIRCUNVALACION DE SAN ANDRES	20.13	SAN ANDRES
15	CIRCUNVALACION DE PROVIDENCIA	10.12	PROVIDENCIA
16	HATILLO (CRUCE DON MATIAS) - TARAZA	68.66	ANTIOQUIA
17	SANTAFE DE ANTIOQUIA - EL TIGRE	117.21	ANTIOQUIA
18	BARBOSA – CRUCE RUTA 45	70.58	ANTIOQUIA
19	CAMILO C - BOLOMBOLO – CIUDAD BOLIVAR	48.40	ANTIOQUIA
20	TOLUVIEJO – SAN ONOFRE – CRUZ DEL VISO	37.56	SUCRE
21	CARRETO – CALAMAR – PR 54	56.97	BOLIVAR - ATLANTICO - CORDOBA - SUCRE
22	LORICA – CHINU; LORICA - COVEÑAS – TOLU - TOLUVIEJO	59.73	CORDOBA - SUCRE
23	PUERTA DE HIERRO – MAGANGUE - YATI	36.28	BOLIVAR
24	ARMENIA - CAJAMARCA	51.21	QUINDIO – TOLIMA
25	IBAGUE - MARIQUITA	52.22	TOLIMA
26	MAMATOCO – TERMINAL MARITIMO	7.30	MAGDALENA
27	LANDAZURI – BARBOSA; PUERTO ARAUJO - CIMITARRA	56.37	SANTANDER
28	HONDA - VILLET	47.37	C/NAMARCA

TOTAL 1624.29

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION SRN

RED NACIONAL CONCESIONADA

GRANDES PROYECTOS

COMPETITIVIDAD

RED NACIONAL DE CARRETERAS





Ministerio de Transporte
República de Colombia

LOGROS EN ADJUDICACIONES EN ADMINISTRACIÓN DE PEAJES

2011-2012



Contratista	Odinsa –PI S.A.
Valor contrato Adición Fecha de inicio Fecha de terminación	\$255.000 millones \$ 8.730 millones junio de 2011 agosto 2015 aprox.
Valor interventoría Adición Fecha de inicio Fecha de terminación	\$12.000 millones \$ 588 millones 17 de agosto de 2011 16 de agosto de 2014
Qué se adjudicó	41 casetas de peajes y 4 estaciones de pesaje
Ejecución a	abril 30 de 2012





¿Sobre Cuál de los siguientes temas le gustaría que se enfatizara en el Informe de Rendición de Cuentas, en la Audiencia Pública que se realizará el próximo 13 de julio de 2012?

Total Votos: 289

✓ Fecha de Publicación:	18-05-2012
✓ Avances del Plan de Desarrollo	
✓ Fortalecimiento Institucional	
✓ Sistema de Peticiones	
✓ Quejas y Reclamos	6,23%
✓ Plan de Mejoramiento	
✓ Plan Estratégico	4,15%





MECI

- ✓ • Seguimiento a la implementación del Modelo Estandar de Control Interno
- ✓ • Formalización de 20 Cartas de Riesgo (aprobadas en Planta Central), correspondientes a 10 procesos.
Cumplimiento: 100%

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

- ✓ **Meta 2011:** Actualizar la certificación del SGC a la norma NTCGP 1000:2009 y mantener la certificación bajo la norma ISO 9001:2008
Avance a 31 de dic. 2011: Actualización certificación SGC NTC-GP 1000:2009
- ✓ **Meta 2012:** Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad del INVÍAS ISO 9001 y NTC GP 1000 2009, implementación de la norma ISO 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información e ISO 20000. Tecnología de la información.
Avance enero- mayo de 2012: Recomendación de la Auditoría externa de recertificar a INVÍAS en las normas ISO 9001 y NTC GP 1000 2009





- ✓ 1. Número de atenciones telefónicas: 15.935
 - ✓ 2. Número de atenciones presenciales: 18.337
 - ✓ 3. Número de atenciones en línea: 758
- TOTAL número de atenciones a través de los diferentes canales: 35.030

✓ **1. Quejas y peticiones frecuentes por teléfono**

- Estado de carreteras
- Señalización de vías
- Información de los peajes

✓ **2. Quejas y peticiones frecuentes por presenciales**

- Inconformidad de obras
- Daños y perjuicios en predios de obras
- Información de proyectos y obras

✓ **3. Quejas y peticiones frecuentes en atenciones en línea**

- Estado de las vías y puentes
- Información de proyectos y obras





Ministerio de Transporte
República de Colombia

2011-2012

Prosperidad
para todos



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MÁS KILÓMETROS **DE VIDA**

RENDIMOS CON HECHOS

